


N. ord.	Cod.	Attività	Durata gg.
1	/	ORGANIZZAZIONE CANTIERE	3
2	01.A02	DEMOLIZIONI e RIMOZIONI	6
3	01.A05	APPOGGI IN MURATURA	5
4	01.A18	TRAVATURA IPE	8
5	01.A18	STRUTTURA DI SOSTEGNO TELAI FINESTRATURE	10
6	01.A09	CORRENTI e COPERTURA CON LASTRE COIBENTATE	17
7	01.A09 01.A18	RIVESTIMENTO COIBENTAZIONE STRUTTURA E INSTALLAZIONE FINESTRATURE	16
8	01.A19	FALDALERIE GRONDE PLUVIALI CONVERSE	7
9	A.P.	INSTALLAZIONE LINEA VITA	5
10	/	PULIZIA e RIMOZIONE CANTIERE	3
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

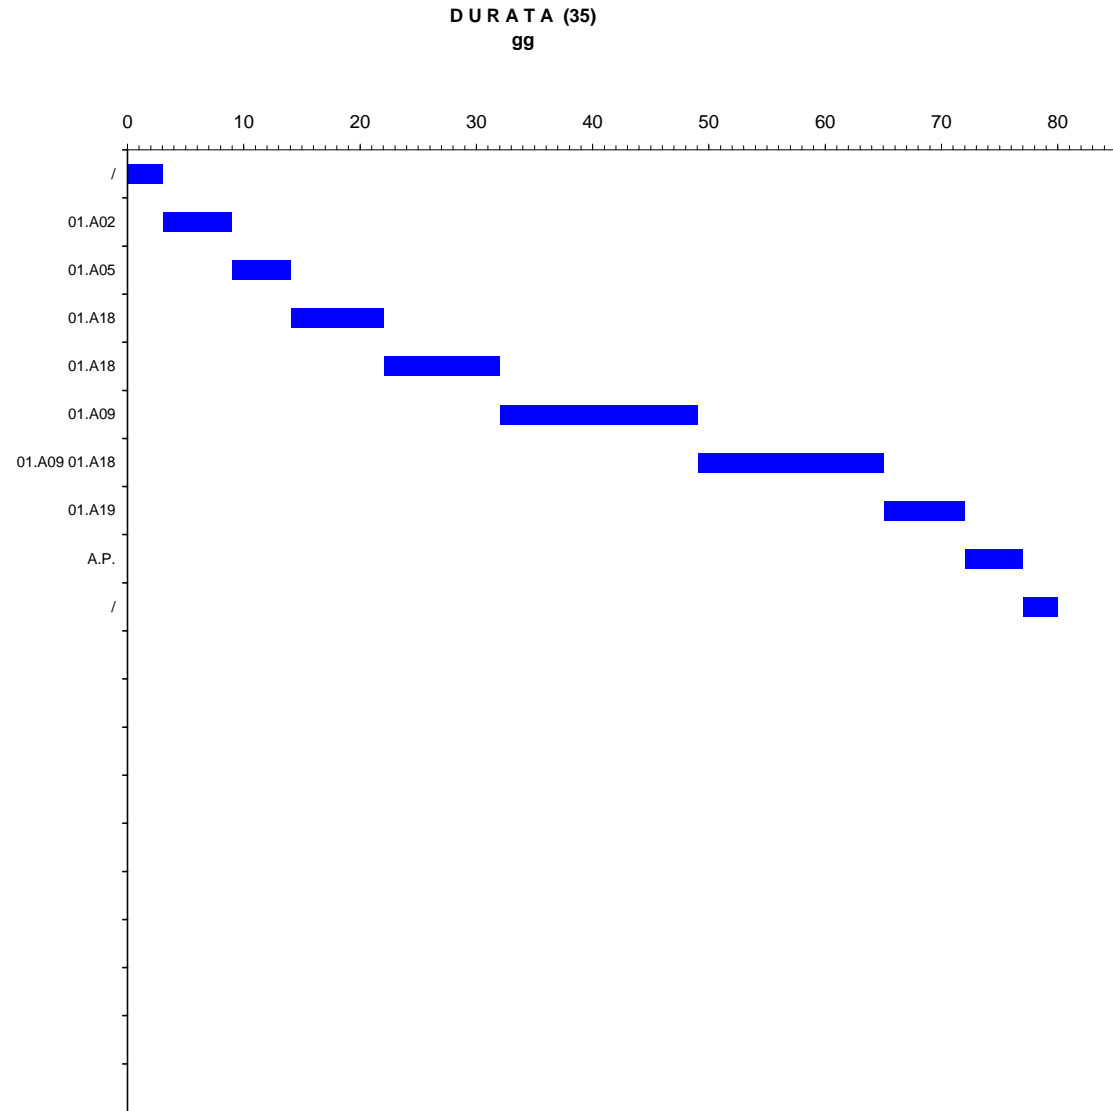

La PENALITA' per il ritardo nella esecuzioni dei lavori è pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.
